Hành trình một dự án

Từ lần liên hệ đầu tiên tới khi tiền về — công việc chảy qua những bộ phận nào, bằng thao tác nào, ở màn hình nào

Đọc để biết: (1) một dự án đi qua những giai đoạn nào; (2) ở mỗi giai đoạn **ai làm**, làm ở **màn hình nào**, **tạo ra cái gì**, **ai phải duyệt**; (3) hồ sơ **chuyển** từ bộ phận này sang bộ phận khác bằng thao tác nào và ai nhận được thông báo; (4) **con số nào** thay đổi khi ai làm gì; (5) bị kẹt thì xem ở đâu.

Ba dòng chảy chạy song song trong mọi dự án. Dòng hồ sơ: thông tin đi từ khách hàng → cơ hội → gói thầu/dự án thiết kế → hợp đồng → công trình, nhập một lần và liên kết, không gõ lại. **Dòng phê duyệt:** mọi hồ sơ cần duyệt về cùng một Hộp thư phê duyệt, đi đúng cấp theo hạn mức. **Dòng tiền và số liệu:** ngân sách → đã cam kết → chi phí thực tế → đã nghiệm thu → phải thu → đã thu, cộng lại thành lãi/lỗ.

Về độ chính xác. Dựng từ các hướng dẫn 01–11 và mã nguồn hiện tại. Hạn mức tiền là **mức tạm**. Phần nào hướng dẫn chưa mô tả chắc (ví dụ cách tạo gói thầu từ cơ hội) được ghi «chưa rõ». Chưa chạy phần mềm; hãy đối chiếu một lần trên bản demo.

1. Ba kiểu dự án, ba đường vào


Kiểu dự án	Người mở đầu	Đường đi	Màn hình đặc trưng
NVC — Nhà xưởng, tổng thầu (~30 dự án/năm)	Kinh doanh	Cơ hội → **Gói thầu** (Dự án – Đấu thầu) → Hợp đồng → Ngân sách → **Công trình** → Mua hàng, Kho, Kế toán → Nghiệm thu → Thu tiền → Bàn giao, bảo hành	Gói thầu, dự toán, ngân sách, nhật ký, nghiệm thu, đề nghị vật tư
NVO — Nhà ở thiết kế + thi công trọn gói (~70 dự án/năm)	Kinh doanh	Cơ hội → **Dự án thiết kế** (6 bước, Phòng Thiết kế) → Hợp đồng thiết kế – thi công → **Bàn giao thi công** → Công trình → (như NVC từ giai đoạn Thi công)	Đầu bài, khảo sát, phương án, hồ sơ ba bộ môn, AI Design
NVS — Giàn giáo, kết cấu thép (~700 đơn/năm)	Xưởng, Kho	Khách hàng → **Hợp đồng thuê** (xuất giáo khỏi kho) → Thu hồi từng đợt → Biên bản hai bên ký → Kế toán nhận khoản phải thu. Lệnh sản xuất mới ở mức khung	Sổ giàn giáo theo lô, biên bản thu hồi


Chuỗi mười hai giai đoạn của một dự án NVC (NVO đi vào ở giai đoạn 3 bằng nhánh thiết kế)

#	Giai đoạn	Bộ phận chính
0	Khách hàng và cơ hội	Kinh doanh
1	Khảo sát nhu cầu	Kinh doanh
2	Báo giá	Kinh doanh + duyệt
3	Gói thầu và dự toán	Dự án – Đấu thầu
4	Hợp đồng	Dự án – Đấu thầu, Kinh doanh
5	Ngân sách và mở công trình	Dự án – Đấu thầu → Thi công
6	Chuẩn bị và bắt đầu thi công	Trưởng phòng Thi công, Quản trị
7	Hằng ngày ở công trường	Chỉ huy trưởng
8	Mua sắm vật tư	Chỉ huy trưởng → duyệt → Mua hàng → Kho
9	Thanh toán	Kế toán, Giám đốc Tài chính
10	Nghiệm thu và thu tiền	Chỉ huy trưởng, Kế toán
11	Phát sinh, bàn giao, bảo hành, quyết toán	Thi công, Dự án – Đấu thầu, Kế toán


2. NVC — giai đoạn 0 tới 5: từ cơ hội tới công trình

Mục tiêu: một khách hàng trở thành một công trình có ngân sách, **không phải nhập lại khách hàng và giá** ở bước nào.

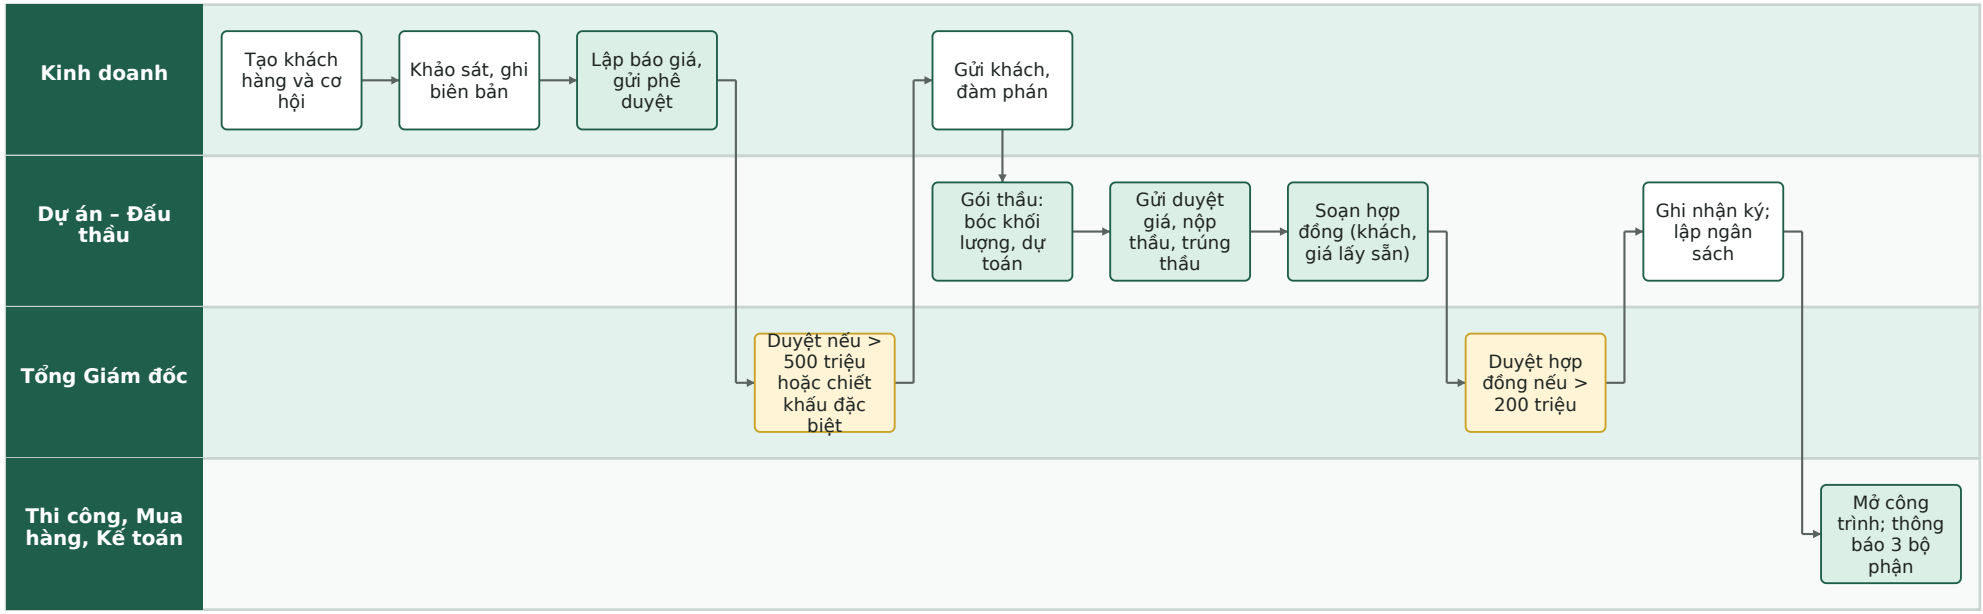


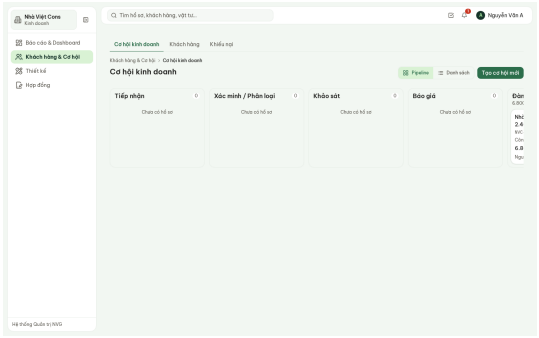

Giai đoạn 0–2: phễu cơ hội

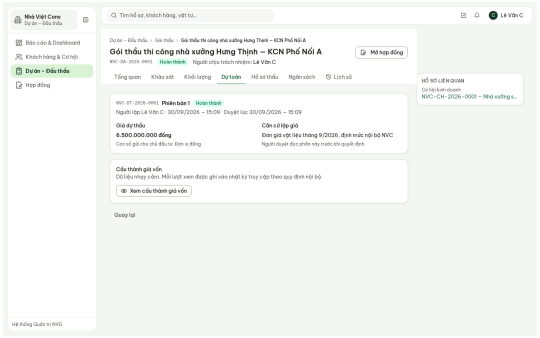

Giai đoạn 3: dự toán đã duyệt (6,5 tỷ)

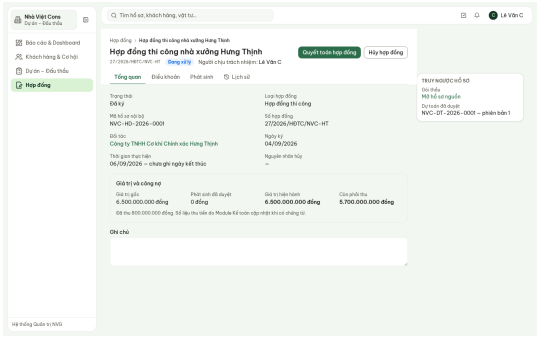

Giai đoạn 4: hợp đồng và truy ngược


Ô xanh nhạt: bàn giao giữa hai vai trò. Ô vàng: điểm kiểm soát hoặc quyết định.


Giai đoạn	Ai làm	Thao tác ở màn hình	Tạo ra	Cổng duyệt (mức tạm)	Chuyển cho
0. Khách hàng, cơ hội	Kinh doanh	Khách hàng & Cơ hội → tab Khách hàng, rồi Cơ hội kinh doanh → Tạo cơ hội mới (khách, tên, loại công trình, giá dự kiến, tiến độ, hạn xử lý)	Khách hàng (dùng chung 3 công ty); Cơ hội ở cột Tiếp nhận	—	Khảo sát
1. Khảo sát nhu cầu	Kinh doanh	Chi tiết cơ hội → tab Khảo sát → Đặt lịch, ghi biên bản (nhu cầu, người quyết định, ngân sách, tiến độ, điều kiện thương mại)	Biên bản khảo sát	—	Báo giá
2. Báo giá	Kinh doanh	Tab Báo giá → Lập báo giá → Gửi phê duyệt → (sau duyệt) Gửi cho khách → Cập nhật phản hồi	Báo giá đã duyệt	**Báo giá:** tới 500 triệu Kinh doanh; lớn hơn hoặc có chiết khấu đặc biệt: Tổng Giám đốc	Đàm phán, Gói thầu
3. Gói thầu, dự toán	Dự án – Đấu thầu	Dự án – Đấu thầu → Gói thầu: tiếp nhận → khảo sát → bóc khối lượng → lập dự toán → Gửi phê duyệt → nộp thầu → Ghi nhận trúng thầu (trượt thầu: bắt buộc nguyên nhân). Cách tạo gói thầu từ cơ hội: chưa rõ	Dự toán có phiên bản, giá dự thầu, cấu thành giá vốn (nhạy cảm)	**Giá dự thầu:** tới 500 triệu Dự án – Đấu thầu; lớn hơn: Tổng Giám đốc	Hợp đồng
4. Hợp đồng	Dự án – Đấu thầu, Kinh doanh	Soạn hợp đồng (nút trên cơ hội ở bước Đàm phán/Ký hợp đồng, hoặc trên gói thầu đã trúng) → Gửi phê duyệt → Ghi nhận đã ký (số hợp đồng, ngày ký) → tab Điều khoản	Hợp đồng; khách và giá tự điền, truy ngược về gói thầu, dự toán, cơ hội	**Hợp đồng:** tới 200 triệu Dự án – Đấu thầu; lớn hơn: Tổng Giám đốc	Ngân sách, Mở công trình
5. Ngân sách, mở công trình	Dự án – Đấu thầu	Gói thầu → tab Ngân sách (lập từ dự toán đã duyệt, theo mã chi phí); Hợp đồng → Mở công trình (hợp đồng đã ký, chưa có công trình, không phải khoán tổ đội)	Công trình ở bước **Chuẩn bị** kèm ngân sách; thông báo cho Thi công, Mua hàng, Kế toán và người chịu trách nhiệm	—	Thi công

Kẹt thì xem: mở hợp đồng → khung bên phải «Truy ngược hồ sơ» cho biết gói thầu, dự toán, cơ hội gốc và khách. Không thấy nút «Soạn hợp đồng»: cơ hội chưa ở Đàm phán/Ký hợp đồng, hoặc gói thầu chưa trúng. Không thấy «Mở công trình»: hợp đồng chưa ký, là khoán tổ đội, hoặc đã có công trình (mỗi hợp đồng chỉ một công trình).


3. NVC — giai đoạn 6 tới 11: thi công, mua sắm, thanh toán, nghiệm thu, thu tiền

Hai vòng chạy song song khi công trình đang thi công: **vòng vật tư và chi tiền** (trên), **vòng nghiệm thu và thu tiền** (dưới).

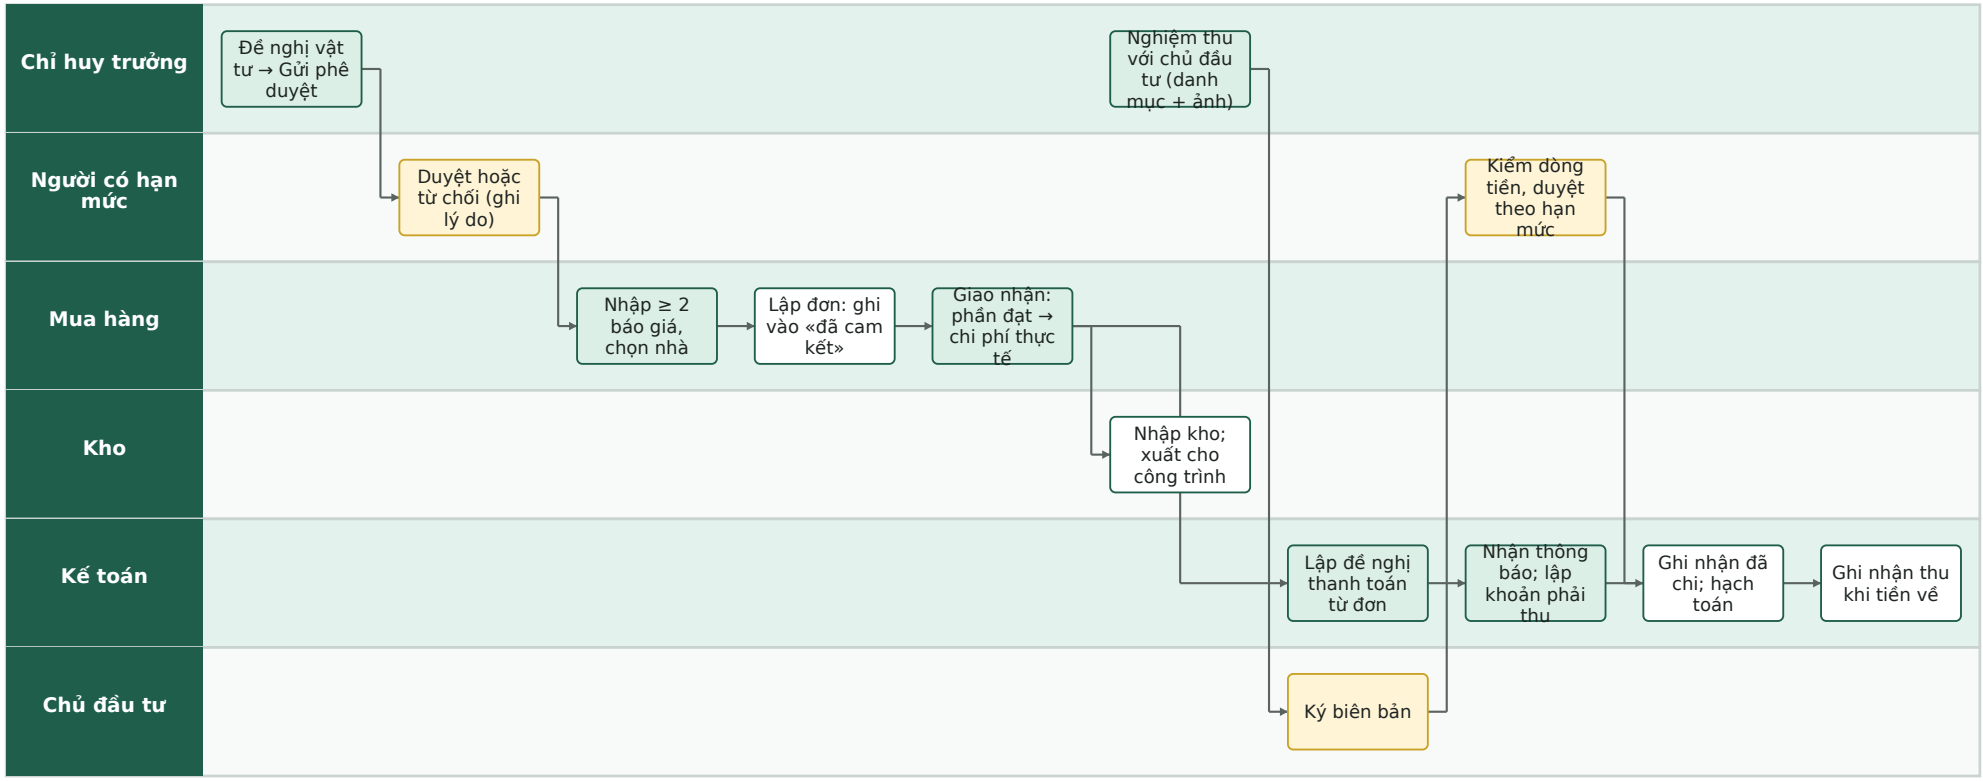




Giai đoạn 8: theo dõi đề nghị

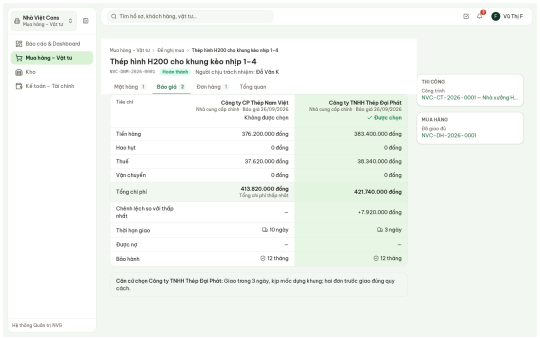

Giai đoạn 8: so sánh báo giá

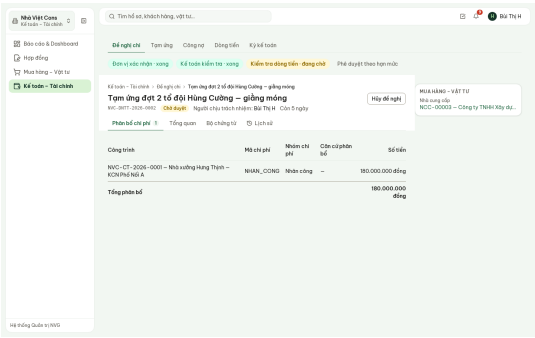


Giai đoạn 9: dải bước đề nghị chi

Giai đoạn	Ai làm	Thao tác ở màn hình	Tạo ra	Cổng duyệt (mức tạm)	Chuyển cho
6. Chuẩn bị, bắt đầu thi công	Trưởng phòng Thi công; Quản trị hệ thống	Phân công chỉ huy trưởng vào công trình (Quản trị → Phân công công trường); Chi tiết công trình → nút «Bắt đầu thi công»; tab Hồ sơ – Bản vẽ phát hành bản vẽ; tab Tổ đội	Công trình ở bước Đang thi công	—	Chỉ huy trưởng
7. Hằng ngày	Chỉ huy trưởng (điện thoại)	Điểm danh bằng ảnh → Ghi nhật ký kèm ảnh → Đề nghị vật tư → Theo dõi đề nghị, Thúc	Điểm danh, nhật ký (không sửa); đề nghị vật tư	—	Trưởng phòng Thi công (xem)
8. Mua sắm vật tư	CHT → người duyệt → Mua hàng → Kho	CHT: Gửi phê duyệt. Người duyệt: Hộp thư phê duyệt. Mua hàng: tab Báo giá (≥ 2) → Chọn nhà (ghi căn cứ nếu không chọn giá thấp nhất) → Lập đơn → tab Giao nhận. Kho: Nhập kho theo phiếu này	Đơn đặt hàng (→ **đã cam kết**); phiếu giao nhận (phần đạt → **chi phí thực tế**); phiếu nhập kho	**Đề nghị mua:** Mua hàng ≤ 10 triệu; CFO ≤ 200 triệu; Tổng Giám đốc trên đó	Kế toán (thông báo khi giao đủ)
9. Thanh toán	Kế toán; Giám đốc Tài chính	Đơn đặt hàng → tab Chứng từ → Lập đề nghị thanh toán (**luôn từ đơn, đừng lập tay**). Các bước: Nháp → Đơn vị xác nhận → Kế toán kiểm tra → Kiểm tra dòng tiền → Phê duyệt theo hạn mức → Đã duyệt, chờ chi → Ghi nhận đã chi → Đánh dấu đã hạch toán. Tổ đội: đề nghị chi có phân bổ vào mã Nhân công	Khoản đã chi; hạch toán sang phần mềm kế toán chính thức	**Đề nghị chi:** Kế toán ≤ 10 triệu; CFO ≤ 200 triệu; Tổng Giám đốc trên đó	Báo cáo, Công nợ
10. Nghiệm thu, thu tiền	CHT lập; chủ đầu tư ký; Kế toán thu	Tab Nghiệm thu → Lập biên bản (loại «với chủ đầu tư» có giá trị > 0, danh mục kiểm tra có ảnh) → Kế toán nhận thông báo → Công nợ → Lập khoản công nợ phải thu → khi tiền về Ghi nhận thu	Biên bản nghiệm thu (không sửa); khoản phải thu; số «đã thu» trên hợp đồng	—	Báo cáo lãi/lỗ (cột Đã nghiệm thu)
11. Phát sinh, bàn giao, bảo hành, quyết toán	Dự án – Đấu thầu, Thi công, Kế toán	Hợp đồng → tab Phát sinh: đề xuất → báo giá → Gửi phê duyệt → khách xác nhận → thực hiện. Công trình: Chuyển sang nghiệm thu bàn giao → Bàn giao chủ đầu tư (cần biên bản với chủ đầu tư đã nghiệm thu) → bảo hành → Kết thúc. Hợp đồng → Quyết toán. Kế toán: khóa kỳ cuối tháng	Giá trị hợp đồng hiện hành; công trình Kết thúc (chỉ đọc); kỳ kế toán đã khóa	**Phát sinh:** Trưởng phòng Thi công ≤ 50 triệu; lớn hơn Tổng Giám đốc	—


4. NVO — nhánh thiết kế, rồi nhập vào đường thi công

Một hồ sơ thiết kế đi qua **sáu bước**; bước hiện tại ghi ở đầu trang hồ sơ. AI Design là công cụ hỗ trợ, không phải một bước.

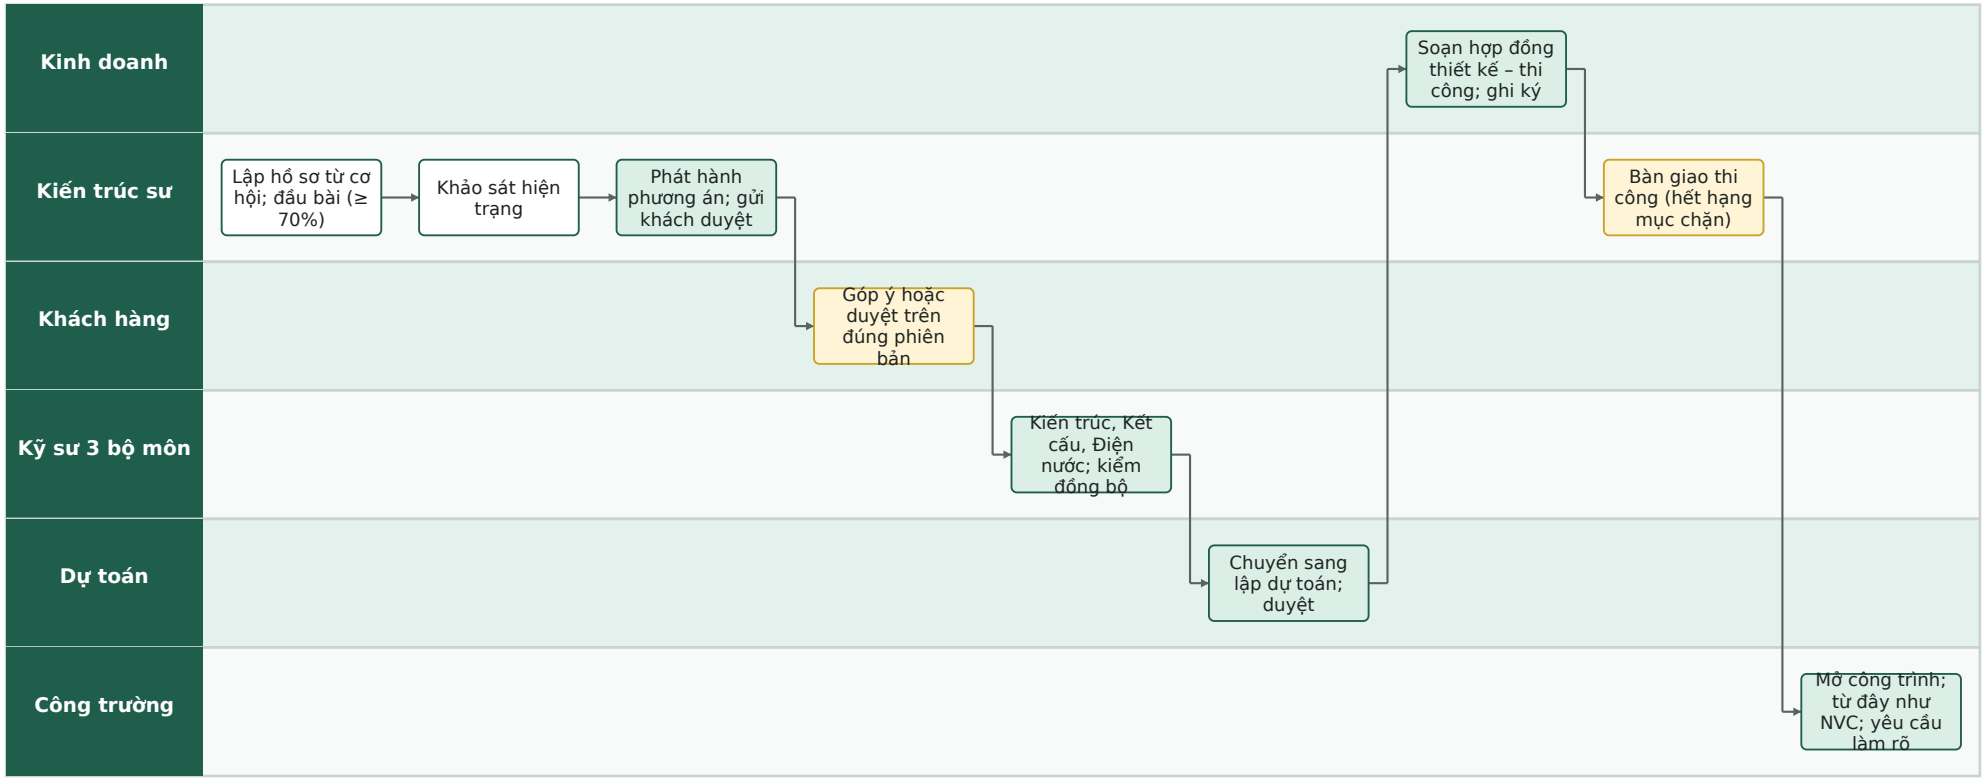

Bước	Ai làm	Thao tác	Tạo ra
Lập hồ sơ, đầu bài	Kiến trúc sư	Thiết kế → Dự án thiết kế → Tạo mới (chọn cơ hội: khách tự điền); Đầu bài thiết kế → điền tới ≥ 70% → Xác nhận đầu bài (khoá; sửa = phiên bản mới + nguyên nhân)	Hồ sơ có mã NVO-TK-…; đầu bài đã xác nhận
Khảo sát	Kiến trúc sư	Khảo sát hiện trạng: số đo, ảnh khu đất, hiện trạng bốn phía; Xuất PDF	Biên bản khảo sát
Phương án, trình khách	Kiến trúc sư; khách hàng	Phiên bản bản vẽ → Thêm phiên bản (Phương án kiến trúc) → Phát hành (các bộ phận liên quan nhận thông báo) → Gửi khách hàng duyệt phương án → Ghi nhận góp ý / Khách hàng duyệt (hồ sơ tự sang Hồ sơ kỹ thuật)	Phiên bản «Khách hàng đã duyệt»
Hồ sơ kỹ thuật	Kiến trúc, Kết cấu, Điện nước	Ba thẻ bộ môn: người phụ trách, tiến độ, hạn; xung đột giữa bộ môn phải xử lý; phát hành từng bộ môn — hệ thống báo Thiết kế, Dự toán–Đấu thầu, Kinh doanh, Thi công, người được phân công	Bản vẽ ba bộ môn đang hiệu lực
Dự toán, hợp đồng	Dự toán; Kinh doanh	Chuyển sang lập dự toán → Gửi phê duyệt (như Dự án – Đấu thầu) → Soạn hợp đồng (giá lấy từ dự toán đã duyệt) → Kinh doanh chốt với khách, ghi nhận ký ở Hợp đồng	Hợp đồng thiết kế – thi công
Bàn giao thi công	Kiến trúc sư	Nút «Bàn giao thi công» chỉ bấm được khi không còn hạng mục chặn → công trình tự mở, ngân sách đi theo, các bên nhận thông báo; hồ sơ chỉ còn xem, trừ: yêu cầu làm rõ, yêu cầu thay đổi, bản điều chỉnh	Công trình bước Chuẩn bị; hồ sơ «Đã bàn giao thi công»


5. NVS — thuê giàn giáo từ hợp đồng tới thu tiền

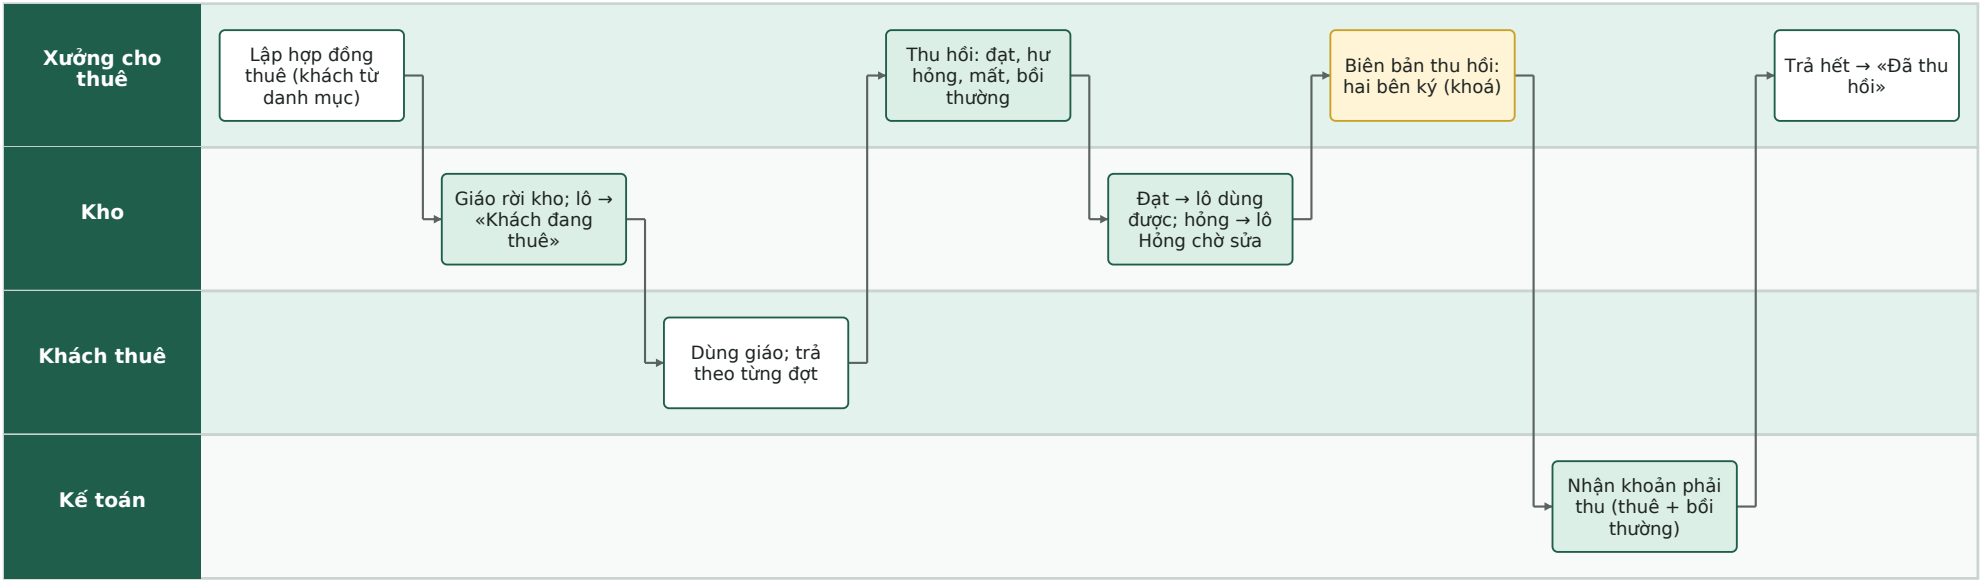

Chưa có: giao thêm giáo giữa kỳ, biên bản giao lúc xuất, biên bản điều chỉnh biên bản đã ký, giá thuê nội bộ giữa công ty, đối soát tất toán theo kỳ. Lệnh sản xuất mới ở mức khung.

6. Con số chảy thế nào trong một công trình

Mỗi cột: một việc xảy ra (hàng trên) làm đổi một con số (hàng dưới). Cộng lại thành lãi/lỗ thực tế.

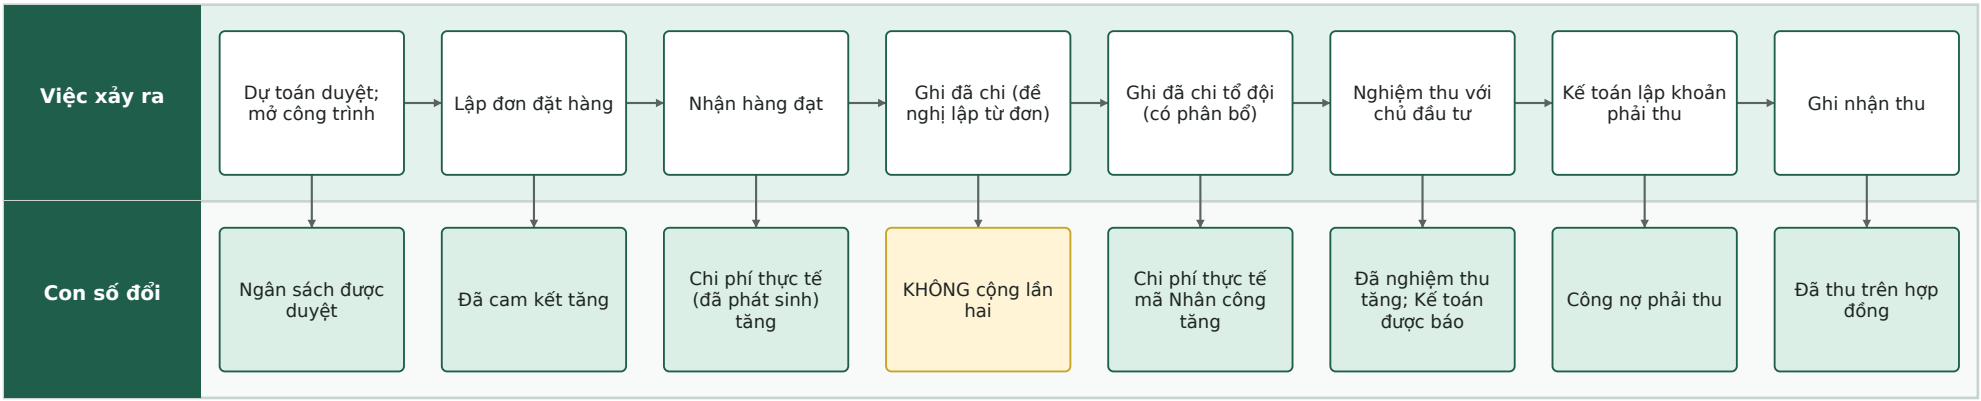

Ví dụ chạy thử trên dữ liệu mẫu «Nhà xưởng Hưng Thịnh» (NVC)

Con số	Giá trị	Xem ở đâu
Giá dự thầu (dự toán đã duyệt)	6.500.000.000 đồng	Dự án – Đấu thầu → Gói thầu → Dự toán
Ngân sách chi phí	5.610.000.000 đồng (người xem được lợi nhuận thấy thêm dòng Lợi nhuận mục tiêu 670.000.000)	Công trình → Ngân sách
Đơn thép hình H200	421.740.000 đồng → vào «đã cam kết», rồi «chi phí thực tế» khi nhận hàng đạt	Mua hàng → Đơn đặt hàng; Kế toán lập đề nghị thanh toán cùng số tiền, ghi đã chi **không cộng lần hai**
Thanh toán tổ đội Hùng Cường	Đợt 1: 420.000.000 (đã chi); đợt 2: 180.000.000 (đang chờ kiểm dòng tiền); phân bổ vào Nhân công	Kế toán → Đề nghị chi
Chi phí đã phát sinh	841.740.000 = vật tư 421.740.000 + nhân công 420.000.000	Công trình → Ngân sách
Nghiệm thu đợt 1 với chủ đầu tư	1.300.000.000 đồng	Công trình → Nghiệm thu
Lãi thực tế	1.300.000.000 − 841.740.000 = **458.260.000 đồng** (chỉ tính phần đã nghiệm thu)	Báo cáo → Lãi/lỗ theo công trình
Công nợ phải thu	1,3 tỷ − đã thu 800 triệu = **còn 500 triệu** (còn phải thu theo hợp đồng: 6,5 tỷ − 800 triệu = 5,7 tỷ)	Kế toán → Công nợ

7. Các điểm bàn giao — hồ sơ chuyển tay thế nào, và kẹt thì xem đâu

Từ → sang	Thao tác bàn giao	Ai nhận được gì	Kẹt thì xem ở đâu
Kinh doanh → Dự án – Đấu thầu	Cơ hội ở Đàm phán; gói thầu	Gói thầu hiện cơ hội trong «Hồ sơ liên quan»	Cơ hội không có hợp đồng: tìm cơ hội, xem bước
Dự án – Đấu thầu → Thi công	Mở công trình từ hợp đồng đã ký	Thông báo Thi công, Mua hàng, Kế toán, người chịu trách nhiệm	Hợp đồng: có nút Mở công trình không? (điều kiện: đã ký, chưa mở, không khoán)
Thiết kế → Thi công (NVO)	Bàn giao thi công	Thông báo các bên; chỉ huy trưởng nhận bản vẽ trên điện thoại	Nút mờ: xem khung Kiểm tra đồng bộ ở Hồ sơ kỹ thuật
Chỉ huy trưởng → người duyệt	Gửi phê duyệt đề nghị vật tư	Hộp thư phê duyệt của người có hạn mức	Theo dõi đề nghị: «Đang giữ» và «Thời gian chờ»; bấm Thúc
Người duyệt → Mua hàng	Duyệt xong	Mua hàng nhận thông báo; thẻ «Đề nghị mua» trên Dashboard	Dashboard Mua hàng: «Đã duyệt, chờ lập đơn» (hạn mức tạm: 48 giờ)
Mua hàng → Kho	Ghi nhận đợt giao hàng	Kho thấy đợt giao ở tab Giao nhận; bấm Nhập kho theo phiếu này	Đơn đặt hàng → Giao nhận: có dòng «Đã nhập kho theo phiếu …» chưa
Mua hàng → Kế toán	Giao đủ	Kế toán nhận thông báo; tab Chứng từ của đơn	Đơn đặt hàng → Chứng từ → Lập đề nghị thanh toán
Chỉ huy trưởng → Kế toán	Nghiệm thu với chủ đầu tư	Kế toán nhận thông báo đủ căn cứ thu tiền	Công trình → Nghiệm thu: biên bản có «Đã nghiệm thu» chưa
Xưởng → Kế toán (NVS)	Ký biên bản thu hồi	Kế toán nhận khoản phải thu ghi mã hợp đồng và mã biên bản	Hợp đồng thuê → Biên bản thu hồi: Chờ ký hai bên?

Quy tắc chung khi hồ sơ kẹt. (1) Gõ mã vào ô tìm kiếm trên cùng để xem hồ sơ và ai đang giữ. (2) Hồ sơ chờ duyệt: xem «Đang giữ» ở Theo dõi đề nghị hoặc Hộp thư của cấp trên. (3) Hồ sơ còn Nháp thì chưa ai ở văn phòng nhận được — Gửi phê duyệt trước. (4) Mọi hồ sơ có tab Lịch sử: ai làm gì, lúc nào.

8. Ai làm gì qua cả dự án (L = làm · D = duyệt · N = nhận việc/thông báo · X = xem)

Bộ phận	0 Khách, cơ hội	1 Khảo sát	2 Báo giá	3 Gói thầu	4 Hợp đồng	5–6 Mở, chuẩn bị	7 Hằng ngày	8 Mua sắm	9 Thanh toán	10 Nghiệm thu, thu tiền	11 Phát sinh, kết thúc
Kinh doanh	L	L	L (báo giá)		L (soạn, ghi ký)						
Dự án – Đấu thầu			D (≤ 500 tr)	L	L; D (≤ 200 tr)	L					L (phát sinh)
Tổng Giám đốc			D (> 500 tr)	D (> 500 tr)	D (> 200 tr)				D (> 200 tr)	X	D (phát sinh > 50 tr)
Giám đốc Tài chính								D (≤ 200 tr)	D (kiểm dòng tiền)	X	
Trưởng phòng Thi công						N	L; X	X		L (bàn giao)	D (≤ 50 tr)
Chỉ huy trưởng							L	L (đề nghị)		L (nghiệm thu)	
Mua hàng						N		L			
Kho								L (nhập, xuất)			
Kế toán						N		N	L	L (phải thu, thu)	L (khóa kỳ)
Quản trị hệ thống						L (phân công)					

Hạn mức tiền trong bảng là **mức tạm** của bản demo, Ban Giám đốc quyết mức chính thức. Hộp thư phê duyệt, Dashboard và Báo cáo lãi/lỗ của Ban Giám đốc đọc kết quả của **mọi** giai đoạn nên không đặt vào một cột.

9. Cổng kiểm: đủ điều kiện sang giai đoạn kế chưa?

Muốn làm	Cần có	Ghi chú
Sang Báo giá	Biên bản khảo sát đã ghi	Cơ hội ở Khảo sát hoặc Báo giá
Gửi báo giá cho khách	Báo giá đã được phê duyệt (chiết khấu đặc biệt: Tổng Giám đốc)	Hệ thống không cho gửi báo giá chưa duyệt
Soạn hợp đồng	Cơ hội ở Đàm phán/Ký hợp đồng, hoặc gói thầu đã trúng	Không có nút tạo hợp đồng trắng
Mở công trình	Hợp đồng đã ký; chưa có công trình; không phải hợp đồng khoán tổ đội	Mỗi hợp đồng một công trình
Bàn giao thi công (NVO)	Ba bộ môn đã phát hành, không còn xung đột; khách đã duyệt phương án; dự toán đã duyệt	Nút mờ nếu còn hạng mục chặn
Gửi đề nghị vật tư	Có công trình, mã chi phí, ngày cần hàng, ít nhất một mặt hàng	Bắt buộc ngày cần hàng; còn Nháp thì chưa ai nhận
Lập đơn đặt hàng	Đề nghị đã duyệt và đã chọn nhà cung cấp (nên ≥ 2 báo giá; chọn nhà không thấp nhất thì ghi căn cứ)	Không có nút tạo đơn trống
Nhập kho	Mua hàng đã ghi nhận đợt giao (phần đạt)	Mỗi đợt chỉ nhập một lần
Lập đề nghị thanh toán	Đơn giao đủ, có bộ chứng từ (phiếu giao nhận, hóa đơn, CO/CQ)	Luôn lập từ đơn để không cộng chi phí hai lần
Lập biên bản nghiệm thu	Chấm đủ mọi mục; mục «Cần ảnh» có ảnh; mục «Không đạt» có «Tồn tại cần khắc phục»; với chủ đầu tư: giá trị > 0	Biên bản đã lập không sửa; sai thì Hủy rồi lập lại
Bàn giao chủ đầu tư / Kết thúc	Có ít nhất một biên bản «Nghiệm thu với chủ đầu tư» ở trạng thái Đã nghiệm thu	Báo «Chưa có biên bản nghiệm thu với chủ đầu tư…» nếu thiếu
Khóa kỳ kế toán	Không còn khoản đã chi mà chưa hạch toán	Sau khóa, mọi khoản chi mang ngày trong kỳ bị từ chối

Chưa có / chưa rõ (nói thật khi giải thích cho người mới). Cách tạo gói thầu từ một cơ hội cụ thể; điểm danh chưa nối chấm công; màn Phân công công trường và Chấm công chưa mở cho Trưởng phòng Thi công với dữ liệu mẫu; xuất sang phần mềm kế toán chính thức; đối soát tất toán giàn giáo; nhiều phần mở rộng của Thi công (RFI, phiếu giao việc, an toàn…). Xem tài liệu 06 để biết danh sách đầy đủ.
