NVC — Nhà Việt Cons

Hướng dẫn từng bước: một công trình nhà xưởng đi từ lần gọi điện đầu tiên tới khi tiền về tài khoản

Đọc xong bạn biết được: công việc của một công trình nhà xưởng đi qua những ai, ở màn hình nào, và mỗi người phải làm gì thì người sau mới làm được.

Cách đọc. Công việc của công ty giống một **cuộc chạy tiếp sức**: mỗi người chạy một đoạn rồi trao gậy cho người kế tiếp. Mỗi **trạm** là một trang, luôn có bốn phần: **Ai làm** · **Làm gì trên máy** · **Xong thì ai nhận tiếp** · **Coi chừng**. Đọc lần lượt từ trạm 1; mỗi trạm đọc khoảng hai phút.

Ai là ai. Kinh doanh (gặp khách, báo giá) · **Dự án – Đấu thầu** (dự toán, hợp đồng) · **Tổng Giám đốc** (duyệt khoản lớn) · **Trưởng phòng Thi công** (quản lý công trình) · **Chỉ huy trưởng** (người ở công trường) · **Mua hàng** · **Kho** · **Kế toán** · **Giám đốc Tài chính**.

Ví dụ xuyên suốt. Công ty Cơ khí Chính xác Hưng Thịnh muốn xây **nhà xưởng 2.400 m² tại KCN Phố Nối A**. Cơ hội 6,8 tỷ đồng; thắng thầu với giá **6,5 tỷ**; ngân sách chi phí 5,61 tỷ. Các con số này là dữ liệu mẫu trong bản demo.

Về độ chính xác. Viết từ các hướng dẫn trong thư mục huong-dan và mã nguồn hiện tại, chưa chạy lại trên bản demo. Hạn mức tiền là **mức tạm** do NVG chưa chốt. Chỗ nào chưa chắc ghi rõ «chưa rõ». Ảnh là ảnh chụp thật từ dữ liệu mẫu.

Chuyến tàu của một công trình NVC



Nhìn lướt: **trạm 1–5** là việc ở văn phòng để biến một khách hàng thành một công trình có ngân sách. **Trạm 6–8** là công trường xin vật tư. **Trạm 9–10** là mua và trả tiền. **Trạm 11–12** là thu tiền và khép hồ sơ.

Ba điều đúng suốt chuyến tàu.
1. Thông tin nhập **một lần**, các bước sau tự lấy, không gõ lại khách hàng hay giá.
2. Mọi thứ cần duyệt đều về **một Hộp thư phê duyệt**, đi đúng người theo hạn mức tiền.
3. Tiền đi theo một đường: ngân sách → đã cam kết (đã đặt đơn) → chi phí thực tế (đã nhận hàng) → đã nghiệm thu → đã thu. Cộng lại ra lãi/lỗ.

TRẠM 1 / 12

Khách hàng và cơ hội

Khách gọi điện, hỏi xây nhà xưởng. Người đầu tiên nhận gậy là Kinh doanh: ghi lại khách này là ai và muốn gì.

Ai làm

Kinh doanh

Làm gì trên máy

1. Vào **Khách hàng & Cơ hội**, mở tab **Khách hàng**, kiểm tra khách đã có chưa (khách dùng chung cho cả ba công ty).

2. Chuyển sang tab **Cơ hội kinh doanh**, bấm **Tạo cơ hội mới**.


3. Điền khách, tên (ví dụ «Nhà xưởng sản xuất linh kiện 2.400 m²»), loại công trình, giá dự kiến, tiến độ, hạn xử lý.

4. Cơ hội xuất hiện ở cột **Tiếp nhận** trên bảng các cột.

Xong thì ai nhận tiếp

Kinh doanh tự đi tiếp sang khảo sát; chưa cần ai khác.

> Chưa vội gõ giá thật. Giá dự kiến chỉ để xếp cơ hội; giá chính thức nằm ở báo giá và dự toán.

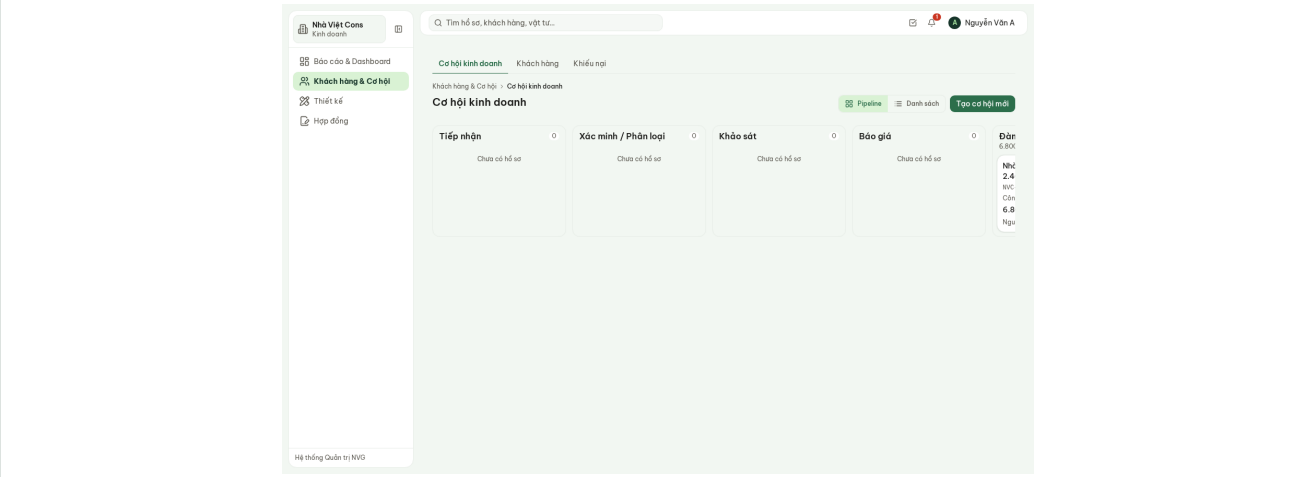

Bảng cơ hội theo cột: Tiếp nhận, Xác minh, Khảo sát, Báo giá...

TRẠM 2 / 12

Khảo sát và báo giá

Kinh doanh gặp khách, hỏi cho kỹ, rồi báo một mức giá sơ bộ. Báo giá lớn phải có sếp gật đầu trước khi gửi đi.

Ai làm

Kinh doanh. Tổng Giám đốc duyệt khi báo giá lớn.


Làm gì trên máy

1. Mở cơ hội, tab **Khảo sát**: đặt lịch, ghi biên bản (nhu cầu, ai quyết định, ngân sách, tiến độ, điều kiện thương mại).
2. Tab **Báo giá**: bấm **Lập báo giá**, điền, bấm **Gửi phê duyệt**.
3. Báo giá được duyệt thì bấm **Gửi cho khách**, sau đó ghi **phản hồi** của khách.
4. Khách đồng ý đàm phán: kéo cơ hội sang bước **Đàm phán**.

Xong thì ai nhận tiếp

Dự án – Đấu thầu nhận để làm gói thầu và dự toán.

Ai duyệt (mức tạm): báo giá tới 500 triệu đồng Kinh doanh tự duyệt; lớn hơn hoặc có chiết khấu đặc biệt thì Tổng Giám đốc duyệt. Báo giá chưa duyệt thì không gửi được cho khách.

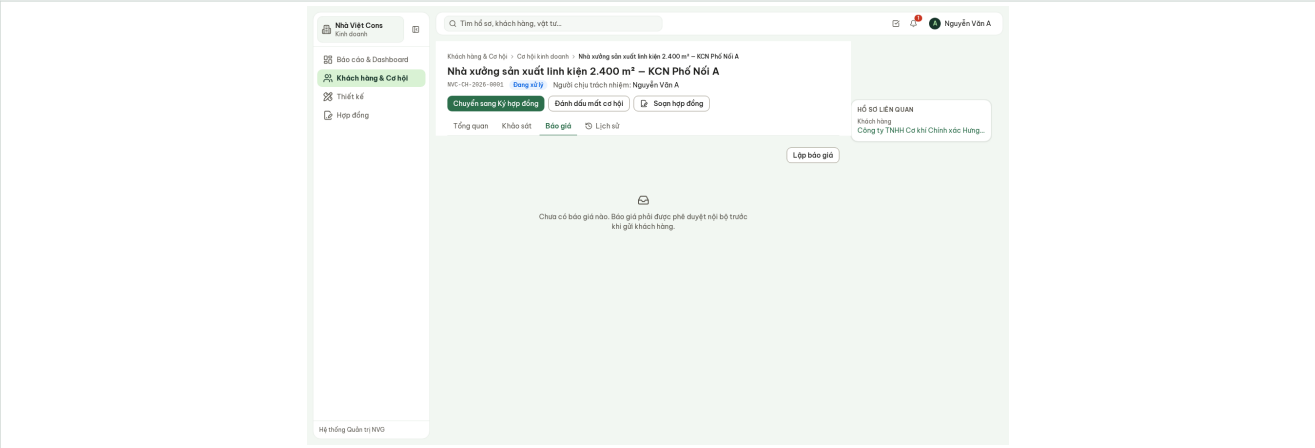

Tab Báo giá: chưa có báo giá thì hệ thống nói rõ phải được phê duyệt nội bộ trước khi gửi khách

TRẠM 3 / 12

Gói thầu và dự toán

Khách đồng ý nói chuyện thật. Giờ cần bóc từng đầu việc, tính xem xây hết bao nhiêu và nộp giá dự thầu. Việc này của Dự án – Đấu thầu.

Ai làm

Dự án – Đấu thầu. Tổng Giám đốc duyệt khi giá lớn.


Làm gì trên máy

1. Vào **Dự án – Đấu thầu → Gói thầu**, mở gói của Hưng Thịnh (cách tạo gói thầu từ cơ hội: **chưa rõ**, hướng dẫn hiện chưa mô tả; hãy kiểm lần đầu trên bản demo).
2. Đi lần lượt các tab: **Khảo sát → Khối lượng → Dự toán** (bóc khối lượng rồi lập dự toán).
3. Ở tab **Dự toán** bấm **Gửi phê duyệt**. Sau khi duyệt, nộp thầu rồi bấm **Ghi nhận trúng thầu** (trượt thầu thì bắt buộc ghi nguyên nhân).
4. Giá vốn và lợi nhuận là thông tin nhạy cảm: nút «Xem cấu thành giá vốn» chỉ người có quyền mới mở, và việc xem được ghi lại.


Xong thì ai nhận tiếp

Dự án – Đấu thầu tự soạn hợp đồng ở trạm sau.

Ai duyệt (mức tạm): giá dự thầu tới 500 triệu Dự án – Đấu thầu; lớn hơn Tổng Giám đốc. Trong ví dụ, dự toán đã duyệt có giá dự thầu **6.500.000.000 đồng**.

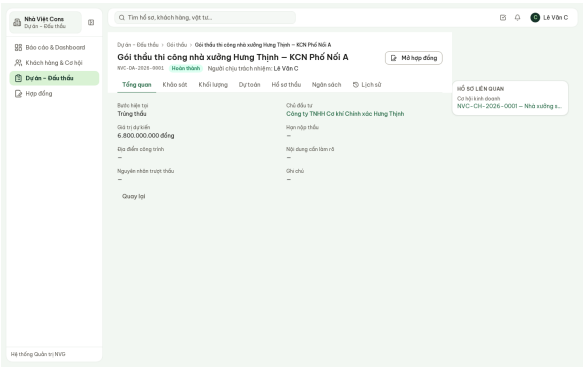

Gói thầu đã trúng

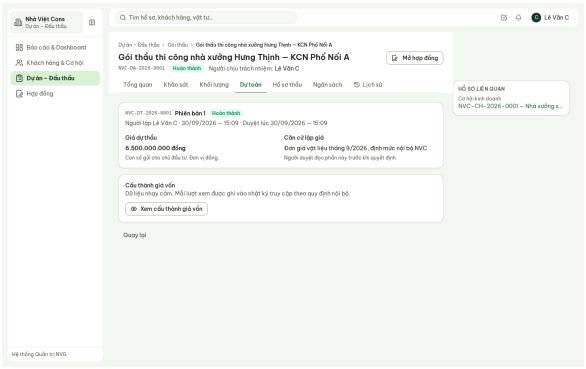

Tab Dự toán: giá dự thầu 6,5 tỷ

TRẠM 4 / 12

Hợp đồng

Hai bên chốt giá và điều khoản bằng một hợp đồng. Hợp đồng là gốc của mọi thứ sau đó: công trình, ngân sách và tiền thu về đều bám vào nó.

Ai làm

Dự án – Đấu thầu soạn; Kinh doanh chốt với khách; Tổng Giám đốc duyệt khi lớn.


Làm gì trên máy

1. Bấm **Soạn hợp đồng**. Nút chỉ hiện khi cơ hội đã ở bước Đàm phán / Ký hợp đồng, hoặc gói thầu đã trúng. Khách và giá **tự điền sẵn**.
2. Bấm **Gửi phê duyệt**; người duyệt xử lý trong Hộp thư phê duyệt.
3. Khi hai bên đã ký giấy: bấm **Ghi nhận đã ký**, nhập số hợp đồng và ngày ký.
4. Tab **Điều khoản**: ghi các mốc thanh toán, bảo hành, phạt.

Xong thì ai nhận tiếp

Dự án – Đấu thầu lập ngân sách và mở công trình.

Ai duyệt (mức tạm): hợp đồng tới 200 triệu Dự án – Đấu thầu; lớn hơn Tổng Giám đốc. Cột bên phải «Truy ngược hồ sơ» cho thấy hợp đồng này đến từ gói thầu, dự toán và cơ hội nào.

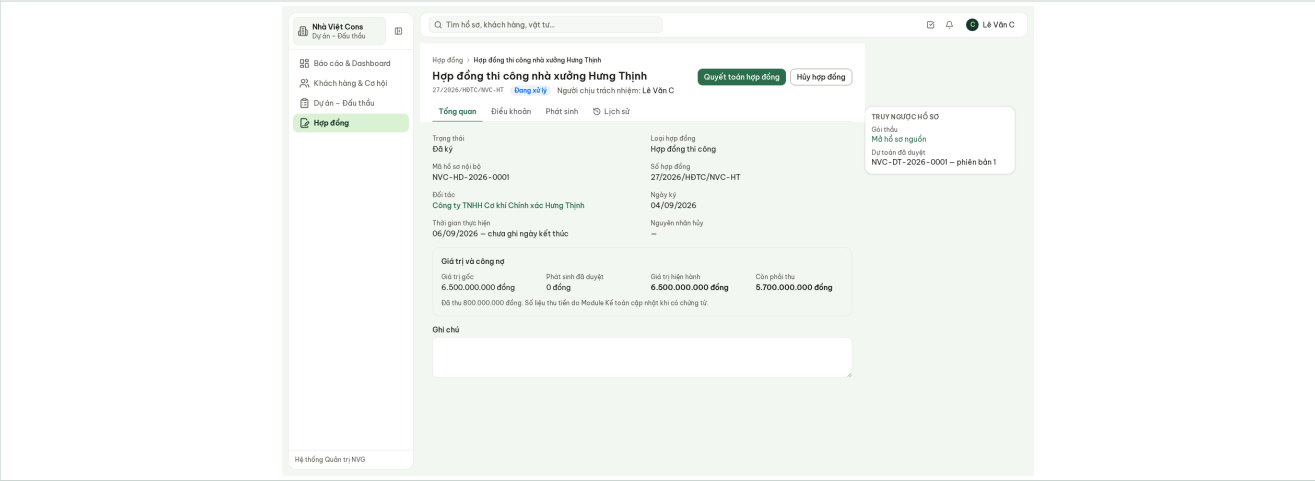

Hợp đồng đã ký: giá trị 6,5 tỷ; đã thu 800 triệu; còn phải thu 5,7 tỷ

TRẠM 5 / 12

Ngân sách và mở công trình

Có hợp đồng rồi, văn phòng phải chia «ví tiền» cho công trình, rồi mở sổ công trình để người ngoài công trường bắt đầu làm.

Ai làm

Dự án – Đấu thầu.


Làm gì trên máy

1. Ở gói thầu, tab **Ngân sách**: lập ngân sách từ dự toán đã duyệt, chia theo mã chi phí (vật tư, nhân công, máy, thầu phụ...).
2. Ở hợp đồng đã ký, bấm **Mở công trình**. Nút chỉ hiện khi hợp đồng đã ký, chưa có công trình, và không phải khoán tổ đội.
3. Hệ thống tạo công trình ở bước **Chuẩn bị** và **gửi thông báo** cho Thi công, Mua hàng, Kế toán.

Xong thì ai nhận tiếp

Trưởng phòng Thi công, Mua hàng và Kế toán cùng nhận thông báo; mỗi hợp đồng chỉ có **một** công trình.

> Ví dụ: ngân sách chi phí 5,61 tỷ cho hợp đồng 6,5 tỷ. Phần chênh là lợi nhuận mục tiêu — Thi công **không nhìn thấy** phần này (cột nhạy cảm bị ẩn).

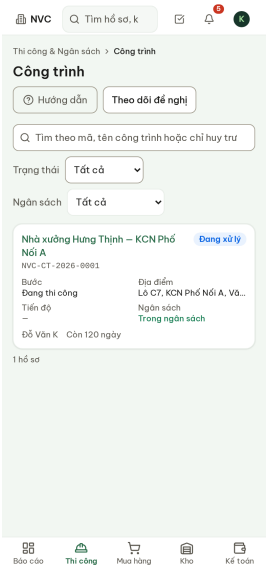

Công trình xuất hiện trong danh sách của người ở công trường

TRẠM 6 / 12

Bắt đầu thi công

Công trường cần người chỉ huy. Ai được giao công trình nào thì chỉ thấy công trình đó, thấy ít hơn chứ không thấy dư.

Ai làm

Trưởng phòng Thi công và Quản trị hệ thống.

Làm gì trên máy

1. Quản trị hệ thống: **Quản trị → Phân công công trường**, chọn chỉ huy trưởng cho công trình. Người chưa được phân công sẽ **không thấy** công trình đó.
2. Trưởng phòng Thi công mở công trình, bấm **Bắt đầu thi công**. Tab **Hồ sơ** để phát hành bản vẽ; tab **Tổ đội** để gán tổ đội.
3. Công trình chuyển từ **Chuẩn bị** sang **Đang thi công**.

Xong thì ai nhận tiếp

Chỉ huy trưởng mở điện thoại là thấy công trình của mình.

Lưu ý: theo hướng dẫn hiện có, vai trò Thi công chưa mở được màn Phân công/Chấm công với dữ liệu mẫu hiện tại; việc này thuộc Quản trị hệ thống. Nên kiểm lại trước buổi demo.

TRẠM 7 / 12

Một ngày ở công trường

Chỉ huy trưởng đứng ở công trường với chiếc điện thoại. Mỗi ngày chỉ cần mấy việc ngắn.

Ai làm

Chỉ huy trưởng, trên điện thoại.

Làm gì trên máy

1. Sáng: **Điểm danh** bằng cách chụp ảnh. Nút chụp luôn nằm sẵn ở màn hình, không ẩn trong menu.


2. Trong ngày: **Ghi nhật ký** (việc làm, thời tiết, nhân lực) kèm ảnh.

3. Cuối ngày kiểm: toàn bộ thao tác nên xong trong **5–10 phút**; vượt 20 phút là người dùng sẽ quay lại Zalo/Excel.


Xong thì ai nhận tiếp

Trưởng phòng Thi công xem nhật ký theo từng ngày. Nhật ký **đã lưu thì không sửa**.

> Cần đổi thông tin ngày hôm trước: lập ghi chú bổ sung, không sửa bản cũ.

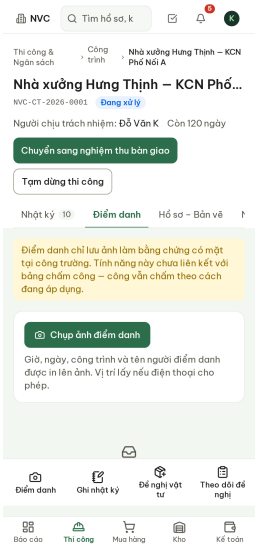

Điểm danh bằng ảnh

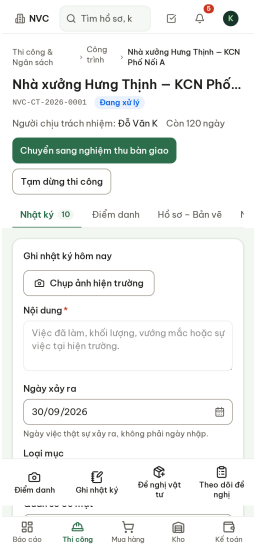

Nhật ký ngày

TRẠM 8 / 12

Đề nghị và duyệt vật tư

Công trường hết thép, cần mua. Chỉ huy trưởng không tự mua mà xin; xin xong thì biết đang kẹt ở đâu.

Ai làm

Chỉ huy trưởng gửi; người có hạn mức duyệt.

Làm gì trên máy

1. Chỉ huy trưởng: **Đề nghị vật tư**, chọn vật tư từ gợi ý, nhập số lượng và ngày cần, bấm **Gửi phê duyệt**.


2. Người duyệt mở **Hộp thư phê duyệt**, duyệt hoặc từ chối (từ chối phải ghi lý do). Duyệt xong hệ thống tự sang hồ sơ tiếp theo.

3. Chỉ huy trưởng mở **Theo dõi đề nghị** để biết đang ở bước nào, ai giữ, chờ bao lâu. Quá lâu thì bấm **Thúc** (có ghi lịch sử, nên không bấm liên tục).


Xong thì ai nhận tiếp

Mua hàng nhận đề nghị đã duyệt.

Ai duyệt (mức tạm): tới 10 triệu Mua hàng; tới 200 triệu Giám đốc Tài chính; lớn hơn Tổng Giám đốc.

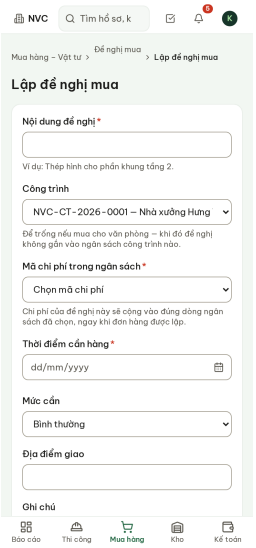

Lập đề nghị vật tư

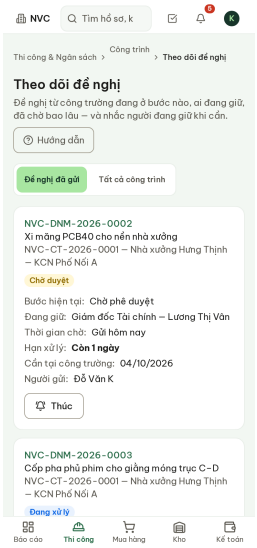

Theo dõi đề nghị

TRẠM 9 / 12

Mua hàng và nhập kho

Mua hàng đi hỏi giá ít nhất hai nơi, chọn nơi hợp lý, đặt hàng. Hàng về thì Kho nhập, đếm và cất.

Ai làm

Mua hàng, rồi Kho.


Làm gì trên máy

1. Mua hàng mở đề nghị đã duyệt, tab **Báo giá**: nhập **ít nhất hai** báo giá, rồi **Chọn nhà cung cấp** (không chọn giá thấp nhất thì ghi căn cứ).
2. Bấm **Lập đơn đặt hàng**: số tiền được ghi vào **«đã cam kết»** của ngân sách.
3. Hàng về: tab **Giao nhận**, ghi phần **đạt**; phần đạt mới tính vào **chi phí thực tế**.
4. Kho: **Nhập kho** theo phiếu giao nhận, sau đó **xuất kho** cho công trình khi cần.


Xong thì ai nhận tiếp

Khi giao đủ, Kế toán nhận thông báo để làm thanh toán.

> Ví dụ: đơn thép **421.740.000 đồng**.

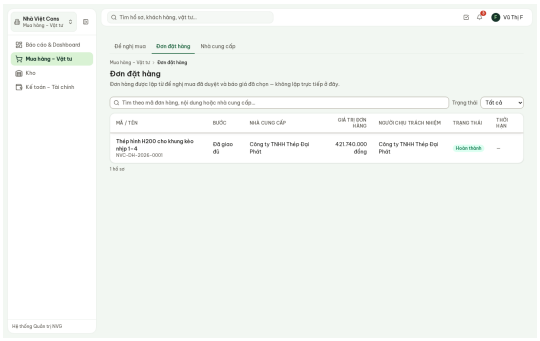

Đơn đặt hàng

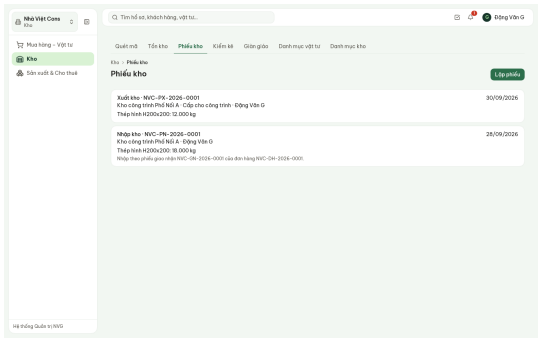

Phiếu kho

TRẠM 10 / 12

Trả tiền nhà cung cấp

Nhà cung cấp đã giao, giờ phải trả tiền. Kế toán không tự chi mà đi đúng các bước kiểm và duyệt.

Ai làm

Kế toán; Giám đốc Tài chính duyệt.

Làm gì trên máy

1. Kế toán mở **đơn đặt hàng → tab Chứng từ → Lập đề nghị thanh toán**. Luôn lập **từ đơn**, không lập tay (lập tay dễ tính tiền hai lần).


2. Đề nghị đi qua các bước: Nháp → Đơn vị xác nhận → Kế toán kiểm tra → Kiểm tra dòng tiền → Phê duyệt theo hạn mức → Đã duyệt, chờ chi.

3. Kế toán bấm **Ghi nhận đã chi** khi chuyển tiền, rồi **Đánh dấu đã hạch toán** sau khi vào phần mềm kế toán chính thức.


Xong thì ai nhận tiếp

Báo cáo công nợ và chi phí tự cập nhật.

Ai duyệt (mức tạm): tới 10 triệu Kế toán; tới 200 triệu Giám đốc Tài chính; lớn hơn Tổng Giám đốc. Hệ thống không thay thế phần mềm kế toán chính thức mà chỉ liên kết.

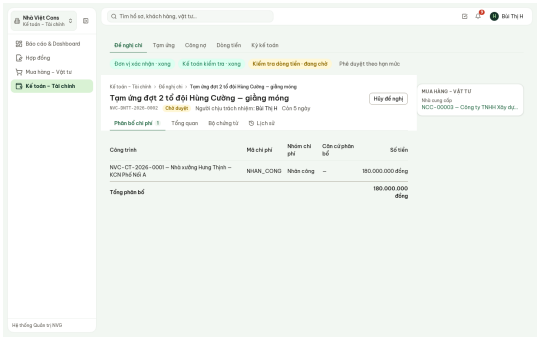

Dải bước của một đề nghị chi

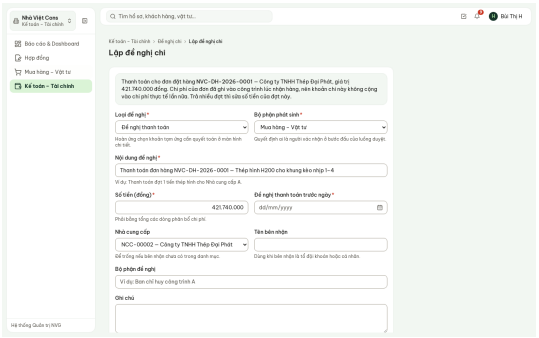

Lập từ đơn hàng

TRẠM 11 / 12

Nghiệm thu và thu tiền

Làm xong một đợt thì phải có người xác nhận «đúng, đạt». Có xác nhận thì mới có quyền đòi tiền.

Ai làm

Chỉ huy trưởng lập biên bản; chủ đầu tư ký; Kế toán thu tiền.


Làm gì trên máy

1. Chỉ huy trưởng: tab **Nghiệm thu → Lập biên bản** với loại «với chủ đầu tư», giá trị lớn hơn 0, chấm từng mục danh mục kiểm tra (có ảnh).
2. Chủ đầu tư ký. Biên bản đã ký **không sửa**.
3. Kế toán nhận thông báo, vào **Công nợ → Lập khoản công nợ phải thu**.
4. Khi tiền về: **Ghi nhận thu**.


Xong thì ai nhận tiếp

Báo cáo lãi/lỗ lấy số «đã nghiệm thu» từ đây.

> Ví dụ: nghiệm thu 1,3 tỷ, đã thu 800 triệu, khoản phải thu còn **500 triệu** (còn phải thu theo hợp đồng 5,7 tỷ).

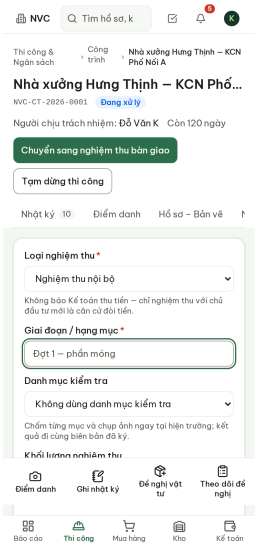

Lập biên bản nghiệm thu

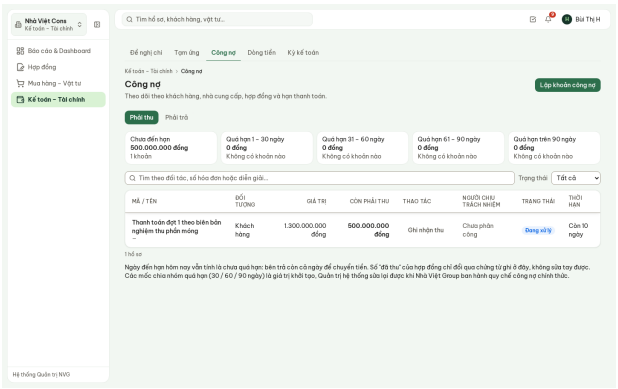

Công nợ phải thu

TRẠM 12 / 12

Theo dõi, phát sinh, kết thúc

Công trình chạy rồi, ai cũng muốn biết: lời hay lỗ, còn nợ ai, ai còn nợ mình.

Ai làm

Ban Giám đốc xem; Thi công, Dự án – Đấu thầu và Kế toán xử lý.


Làm gì trên máy

1. **Báo cáo → Lãi/lỗ**: lãi/lỗ = đã nghiệm thu − đã phát sinh. Ví dụ: 1,3 tỷ − 841,74 triệu (vật tư 421,74 + nhân công 420) = **458,26 triệu**.
2. Có việc ngoài hợp đồng: hợp đồng → tab **Phát sinh**: đề xuất → báo giá → Gửi phê duyệt → khách xác nhận.
3. Cuối công trình: **Chuyển sang nghiệm thu bàn giao → Bàn giao chủ đầu tư** (cần biên bản chủ đầu tư đã nghiệm thu) → bảo hành → **Kết thúc**.
4. Hợp đồng: **Quyết toán**. Kế toán **khóa kỳ** cuối tháng; kỳ khóa không sửa trực tiếp mà phải có chứng từ điều chỉnh.

Xong thì ai nhận tiếp

Khép hồ sơ. Công trình Kết thúc chỉ còn xem.

Ai duyệt phát sinh (mức tạm): tới 50 triệu Trưởng phòng Thi công; lớn hơn Tổng Giám đốc. Chỉ số chưa đủ dữ liệu hiện «Chưa đủ dữ liệu» chứ không hiện số 0.

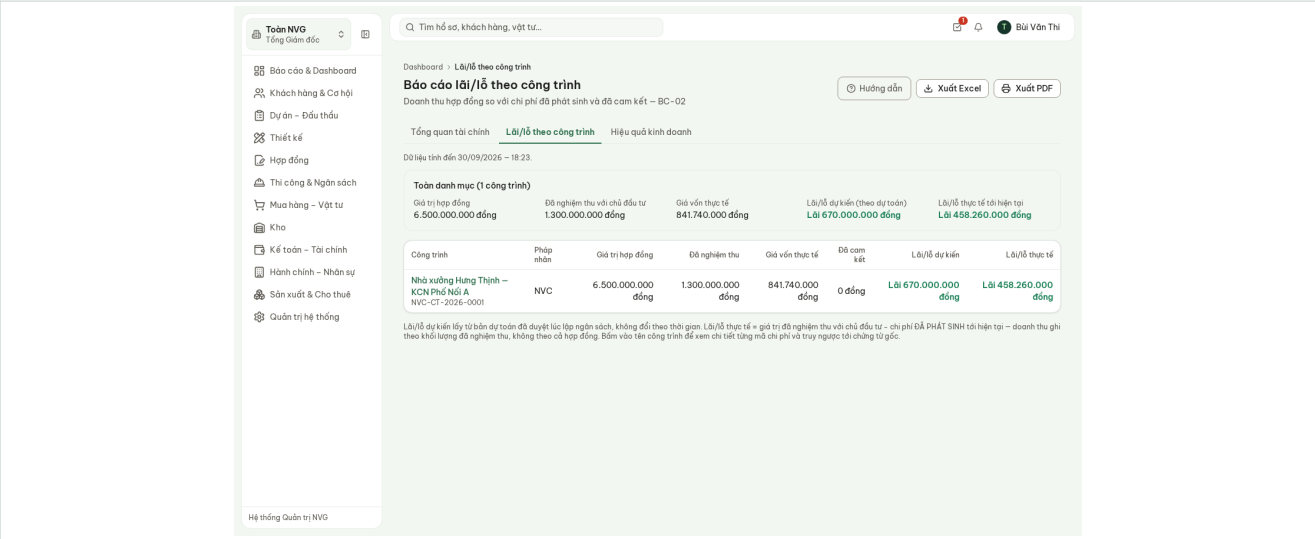

Báo cáo lãi/lỗ

Tóm tắt một trang

#	Trạm	Ai làm	Để lại gì cho người sau
1	Khách hàng và cơ hội	Kinh doanh	Cơ hội ở cột Tiếp nhận
2	Khảo sát và báo giá	Kinh doanh (+TGĐ)	Báo giá đã duyệt
3	Gói thầu và dự toán	Dự án – Đấu thầu	Giá dự thầu đã duyệt
4	Hợp đồng	Dự án – Đấu thầu	Hợp đồng đã ký, truy ngược được
5	Ngân sách, mở công trình	Dự án – Đấu thầu	Công trình + thông báo ba bộ phận
6	Bắt đầu thi công	Thi công, Quản trị	Công trình Đang thi công
7	Ngày công trường	Chỉ huy trưởng	Điểm danh, nhật ký
8	Đề nghị vật tư	CHT → người duyệt	Đề nghị đã duyệt
9	Mua hàng, nhập kho	Mua hàng, Kho	Đã cam kết → chi phí thực tế
10	Trả tiền	Kế toán, CFO	Đã chi, đã hạch toán
11	Nghiệm thu, thu tiền	CHT, Kế toán	Biên bản + khoản phải thu
12	Theo dõi, kết thúc	BGĐ, Thi công, Kế toán	Lãi/lỗ, quyết toán

Những chỗ hay vấp

- Không thấy nút **Soạn hợp đồng**: cơ hội chưa ở Đàm phán / Ký hợp đồng hoặc gói thầu chưa trúng.
- Không thấy **Mở công trình**: hợp đồng chưa ký, là khoán tổ đội, hoặc đã có công trình.
- Không thấy công trình ở điện thoại: chưa được phân công.
- Lập đề nghị thanh toán tay thay vì từ đơn: dễ cộng hai lần.
- Không sửa được biên bản đã ký, nhật ký, chứng từ kỳ đã khóa: đúng thiết kế, cần chứng từ điều chỉnh có người duyệt.
- Mọi hạn mức tiền trong tài liệu này là **mức tạm**; hỏi Quản trị hệ thống mức đang cấu hình.
